

Département de l'Ardèche

Maître d'ouvrage

COMMUNE DE LARGENTIERE

3 avenue Félicien Blanc
07110 LARGENTIERE

Opération

Requalification des traversées d'agglomération
Aménagement de la RD305

Tranche Ferme
Pont des Remparts à la Place du Marché

COMPTE RENDU N° 1


Réunion de démarrage des travaux du 16/01/2017 à 14h00

ORGANISMES	Adresses	☎ / 📠	Représentés par	P	A	E	D	C
Maître d'ouvrage	Commune de LARGENTIERE 3 avenue Félicien Blanc 07110 LARGENTIERE ✉ contact@largentiere.fr	☎ 04 75 39 28 60 📠 04 75 39 20 58	Jean Roger DURAND (maire) Clément EMMANUEL (adj.)	X X			X	X
SEBA	SEBA La Sigalière - Les Vergnades - 07110 LARGENTIERE	☎ 04 75 89 96 96	Jean PASCAL (Président) Cyril OLLIER - c.ollier@seba-eau.fr Laurent THERON - l.theron@seba-eau.fr				X X	
Maître d'œuvre	RHONE CEVENNES INGENIERIE 10 rue Vaucanson – 07200 AUBENAS ✉ aubenas@rci-inge.com	☎ 04 75 89 97 50 📠 04 75 89 97 59	Antoine BROUSSE abrousse@rci-inge.com / 06 21 01 15 26	X			X	X
Entreprise LOT 1 Réseaux humides	FAURIE SAS Quartier Chantoiseau – BP 7 07320 SAINT AGREVE ✉ st.agreve@faurie-sas.fr	☎ 04.75.30.15.55	Sébastien BRENAS (conduc. travaux) s.brenas@faurie-sas.fr / 06.08.70.06.95 Anthony GENTON (chef de chantier) 06.80.59.43.87	X X			X	X
LOT 2 -Travaux Voirie Entreprise Mandataire	SATP 12 route de Montélimar- BP 80105 07202 AUBENAS CEDEX	☎ 04.75.93.02.47 📠 04 75 93 45 75	Bernard FAY Stéphane BRUCHET satp07@satp07.fr / 06 18 30 17 74	X			X	X
Entreprise Co-traitante	Entreprise MANENT ET FILS Le Berjoux - 07110 UZER	☎ 04 75 39 10 68 📠 04 75 39 10 68	Franck MANENT manentp@orange.fr / 06.22.35.33.38	X			X	X
CSPS	ALPES CONTROLES 19 Bis rue Jean Bertin 26000 VALENCE valence@alpes-controles.fr	☎ 04.75.82.90.34	Alain COURBON acourbon@alpes-controles.fr			X	X	
Département	Direction des Routes Route de Montélimar BP170 07202 AUBENAS Cedex	☎ 04 75 35 84 10	Olivier EVESQUE oevesque@ardeche.fr Alain AOMAR aaomar@ardeche.fr				X	
	Direction des Transports Hôtel du Dpt. - Quartier La Chaumette BP 737 - 07007 PRIVAS Cedex	☎ 04 75 66 98 98	Alexandre FREGIERE afregiere@ardeche.fr	X			X	

P : Présent – A : Absent – E : Excusé – D : Diffusion – C : Convocation

ORDRES DE SERVICE – LOT 1		
N°	Motif	Date
1	Démarrage des travaux	23/11/2017
2	Arrêt des travaux	29/11/2017
3	Reprise des travaux	15/01/2018

ORDRES DE SERVICE – LOT 2		
N°	Motif	Date
1	Démarrage des travaux	A VENIR 19/03/2018

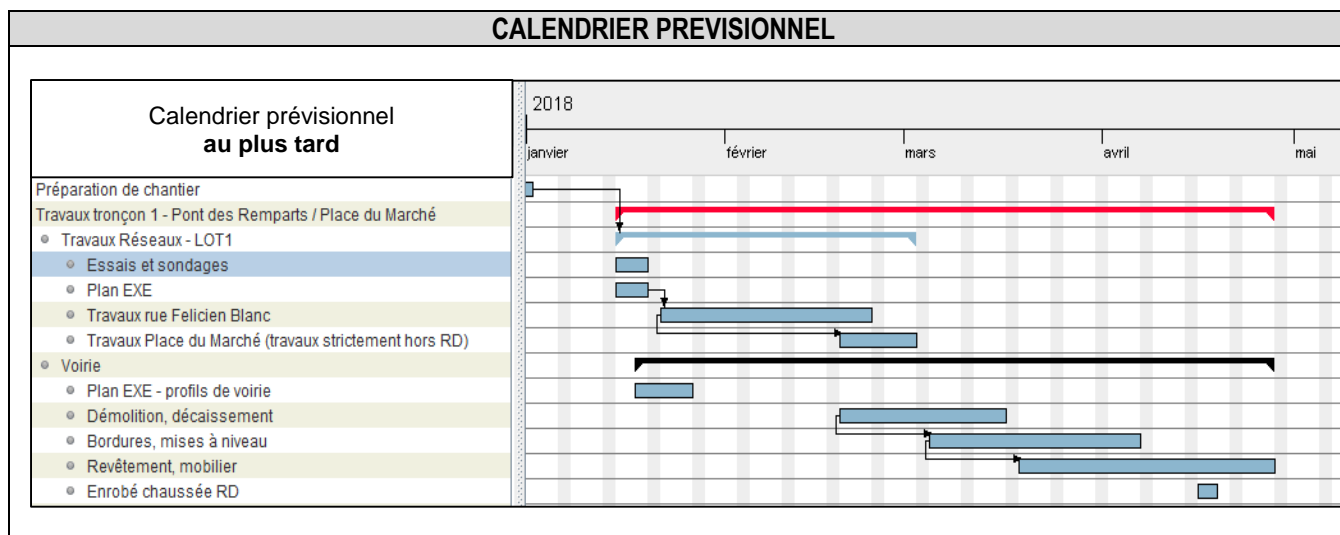

RECOMMANDATIONS / PRESCRIPTIONS PARTICULIERES	
Organismes concernés	Descriptif
FAURIE	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Démarrage des travaux LOT1 – FAURIE</u> cette semaine : Mise en place signalisation des travaux : 17/01/18 Sondages : 18/11/2018 Démarrage pose réseau EP depuis l'aval : 22/01/18
SATP / Manent	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Démarrage des travaux LOT2 – SATP / Manent</u> : Décaissement et préparation : démarrage le 19/02/18 au plus tard, la période buttoir pour réalisation des enrobés de la RD305 est lors des vacances scolaires de printemps du 7 au 20 avril. Les enrobés sont programmé pour la semaine du 16 avril au plus tard.
FAURIE	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Signalisation de chantier</u> : l'entreprise FAURIE veillera à mettre en place et à maintenir une signalisation et un balisage de chantier adaptés. Fonctionnement par alternat feu tricolore, du pont des remparts à la place du marché, puis au niveau de la place de l'Eglise. Au croisement RD5 / RD305 : la mise en place d'un alternat par 3 feux tricolores (dont 2 sur RD5 en recul de part et d'autre du croisement) permettrait de gérer la giration des bus au croisement sans voitures en attente au milieu → l'entreprise FAURIE voit ce qui peut être mis en place.
SATP FAURIE	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Réalisation des plans EXE</u> : SATP prépare rapidement, au plus tard pour semaine prochaine les plans d'EXE de voirie avec les profils de chaussée, notamment au droit des regards EP. Tracé du réseau EP (et position + niveau fini des regards) à adapter en fonction des profils de voirie (→ des mises au point entre FAURIE et SATP sont à prévoir) et sur la place du marché +antennes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Essais de circulation de bus : réalisé ce jour avec un bus 59 places. L'emprise nécessaire a été repéré sur site, notamment au niveau du virage en bas des escaliers de la montée Mazon, et au niveau du virage au croisement rue C. Vielfaure → A prendre en compte pour le balisage de chantier et pour le tracé du réseau.
FAURIE	<ul style="list-style-type: none"> • Vu ce jour l'emplacement des sondages à prévoir par FAURIE, notamment pour sonder la présence de caves. FAURIE réalisera un compte rendu et des photos des sondages → à transmettre à RCI + mairie • <u>Horaire des travaux</u> : 8h00 → 12h00 / 13h00 → 16h30 • <u>Horaires des passages de bus</u> : 7h45 → 8h20 / 16h10 → 17h05 + mercredi midi 12h00 → 13h00 Le passage des bus devra s'organiser au mieux en convoi, prévu le matin, plus délicat le soir, en raison d'horaire décalé de sortie des établissements scolaires. Le service de transports scolaires comprend 12 bus, dont 7 bus de 59 places

RECOMMANDATIONS / PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Organismes concernés	Descriptif
FAURIE Mairie / Dpt Service transports	<ul style="list-style-type: none"> • Un constat d'huissier a été (ou sera) réalisé pour l'entreprise FAURIE, qui transmettra copie à la mairie et RCI. • <u>Dépôt de remblai vers la nouvelle voie</u> au-dessus des anciennes usines : la mairie et le Département confirmeront la possibilité et conditions de dépôt de remblais sur le site • <u>Deuxième tranche de travaux</u> : la circulation sur RD305 étant coupée et déviée par la nouvelle voie (consultation des travaux en cours), les rotations et retournement de bus sur la place de l'Eglise devront être anticipés. Le département et les transporteurs peuvent prévoir une zone tampon à la Ségalière, avec une rotations de bus plus petits → à confirmer au plus tard à la rentrée de <u>septembre 2018</u>. • <u>Les réunions de chantier hebdomadaires sont programmées les mardis matin à 8h30 sur le chantier.</u>

AVANCEMENT DES TRAVAUX

CR N°	Date	Descriptif	%
1	16/01/2018	Préparation de chantier, plan EXE en cours.	

Le présent compte rendu étant diffusé à tous les intervenants, sauf contestations formulées par écrit sous huit jours, il sera considéré comme validé.

Prochaine réunion : Mardi 23 janvier 2018 à 8h30 sur le chantier

Dressé par RHONE CEVENNES INGENIERIE, Ingénieurs Conseils
Aubenas, le 16 janvier 2018
